Guide de décommissionnement

Guide de Décommissionnement d'applications

Avis de confidentialité

Ce document contient des informations qui sont destinées à l'usage exclusif de iA Groupe financier.

Sous réserve d'une approbation d'un représentant dûment autorisé de iA Groupe financier, toute reproduction de ce document, ou sa distribution à l'extérieur de son groupe autorisé d'utilisateurs est interdite.

Table des matières

1. Introduction

1.1. Portée

1.2. Contexte

1.3. Description

2. Décommissionnement d'applications

1.4. Aperçu du processus

1.5. Activités

3. Checklist des ressources logicielles TI

4. Checklist des ressources matérielles TI

5. Guides pour les équipes des ressources informatiques connexes

1.6. Opérations de sécurité (Cryptographie)

1.7. Opérations de sécurité – Sécurité réseau

1.8. Gestion des identités et des accès – Implémentation

1.9. Opérations de sécurité – Sécurité applicative

1.10. Opérations de sécurité – Gestion des vulnérabilités

1.11. Conseillers en SI

Annexe A. Registre d'approbation

Annexe B. Historique des révisions

Annexe C. Références

Guide de Décommissionnement d'applications

Description	Valeur
Propriétaire du guide	Directeur, Protection et analyse en sécurité de l'information
Objectifs du guide	Fournir des instructions simples et complètes pour soutenir le processus de mise hors service des applications informatiques. Ce guide prend en charge l'application de la norme de sécurité des applications et des exigences iA non fonctionnelles pour les solutions.
Date de révision	2022-01-24
Date d'approbation	2022-02-02

Description	Valeur
Date d'entrée en vigueur	2022-02-02
Fréquence de révision	Annuellement ou à la suite de changements majeurs
Prochaine révision	2023-02-02

Introduction

Portée

Le *Guide de Décommissionnement d'applications* S'applique à iA Groupe financier (iAGF). Plus précisément, il s'applique à toutes les applications informatiques et à leurs services informatiques associés.

L'utilisation de « iA Groupe financier » ou de la « Société » dans ce document fait référence à iA Société financière inc. et à ses filiales.

Ce guide est à utiliser comme point de départ pour s'assurer que des étapes ou des considérations importantes ne soient pas oubliées lors de la mise hors service d'une application. Il n'est pas possible d'anticiper toutes les variables dans un seul document. Il faut donc s'assurer de prendre en compte les éléments propres à l'application et au-delà de la portée de ce guide.

Contexte

Les architectes de solutions sont tenus de gérer efficacement et de réduire la dette technologique de leurs solutions (SS-RELI-11, iA NFRs. Voir les références à la fin du document).

Certaines raisons peuvent être identifiées pour justifier la mise hors service d'une application. Cela inclut, mais sans s'y limiter, les risques d'obsolescence technologique, les risques de sécurité, les coûts de licence, les déficits de documentation du système, le manque de sponsor ou de financement, l'activité réduite ou inexistante des utilisateurs et le manque de personnel.

Une fois qu'un architecte de solution décide qu'une application serait candidate à la mise hors service, ce guide devrait être utilisé afin de fournir des informations importantes sur les prochaines étapes. Les applications faisant normalement parties de services et de processus TI et affaires. La décision devrait impliquer les principales parties prenantes de ces services et processus connexes.

Préalables

Il y a quelques étapes dans le processus, comme il est détaillé dans la section suivante. La création d'un projet de décommissionnement d'application et l'identification d'un chargé de projet font partie des conditions de succès. L'architecte de solution correspondant, l'architecte d'entreprise sectoriel, le directeur informatique et l'équipe produit doivent tous avoir des responsabilités dans ce projet de décommissionnement. Veuillez également noter l'importance de la « date de mise hors ligne» et de la « date de fin». Ces dernières doivent être choisies avec soin et être communiquées clairement.

Décommissionnement d'applications

Aperçu du processus

Ce guide est adapté des meilleures pratiques informatiques pour le décommissionnement de services de l'Université du Nebraska. Voir la section de référence pour plus de détails. Les termes, rôles et procédures ont été adaptés à la terminologie, aux rôles et à la méthodologie actuels d'iA.

Le processus est le suivant :

1. **Lancer la mise hors service de l'application**

Soumission et approbation de la demande de décommissionnement.

2. **Créer le plan de décommissionnement**

   Chargé de projet pour le décommissionnement, responsabilités, analyse des impacts et jalons.

3. **Obtenir l'approbation finale**

   Approbation du plan de décommissionnement et demande de gestion des modifications.

4. **Mettre l'application hors ligne**

   Plan de communication, date de déconnexion, accès et suivi de suppression.

5. **Mettre l'application hors service**

   Archivage, migration des fonctions, désactivation des ressources logiques informatiques (checklist).

6. **Terminer l'application**

   Suppression/suppression des ressources, licences et matériels récemment désactivés.

7. **Conclure la mise hors service**

   Désaffectation des ressources humaines, décommissionnement terminé.

8. **Effectuer la post-mise hors service - Suppression des données**

   Suppression d'archives, suppression d'entrées Hopex.

Table 1 : RACI recommandé pour le processus

	Architecte Entreprise Sectoriel	Architecte Solution	Directeur TI	Chargé Projet	Équipe Produit	Changement TI	Comptabilité TI	Ressources logicielles TI	Ressc maté
Lancer la mise hors service de l'application	**C**	**A, R**	**C**						
Créer le plan de décommissionnement		**R**	**C**	**A, R**	**C**				
Obtenir l'approbation finale		**R**	**C**	**A, R**		**C**			
Mettre l'application hors ligne		**A**		**A, R**	**R**			**C**	
Préparer à mettre hors service		**A**		**A**	**R**			**C**	
Terminer l'application		**A**		**A**	**R**		**C**	**C**	
Conclure la mise hors service		**I**	**R**	**A, R**	**I**				
Effectuer la post-mise hors service - Suppression des données		**A, R**						**C**	

*** Les termes du RACI sont dérivés de la version anglaise.**

Checklist

Étape 1. Lancer la mise hors service de l'application.

- [ ] L'architecte de solution soumet la demande de mise hors service, y compris la justification de l'action, à son architecte d'entreprise sectoriel et à son directeur informatique.
- [ ] L'architecte de solution vérifie que la demande de la mise hors service est approuvée au niveau de l'architecte d'entreprise et du directeur informatique.
- [ ] L'architecte de la solution informe l'équipe produit correspondante.

Jalon : Approbation de la demande de décommissionnement de l'application par le propriétaire d'actif

Étape 2. Créer le plan de décommissionnement.

- [ ] Le directeur informatique affecte un chargé de projet pour le décommissionnement.
- [ ] Le chargé de projet identifie et documente qui est responsable des parties déléguées du processus.
- [ ] L'architecte de solutions identifie et documente si et comment la mise hors service de l'application aura un impact sur les services, les processus et leurs utilisateurs associés.
- [ ] L'architecte de solutions identifie et met en corrélation les types d'utilisateurs et d'autres services informatiques qui utilisent l'application.
- [ ] L'architecte de solution identifie si des alternatives sont disponibles et identifie des applications alternatives tout en définissant un plan de migration.
- [ ] L'architecte de solution élabore un plan de gestion du changement ainsi qu'un plan de communication pour chaque type d'utilisateur et de sous-service (y compris la stratégie, l'évaluation d'impact et les alternatives et les voies de migration).
- [ ] Le chef de projet fixe des dates cibles pour les 7 jalons suivants et les communique à l'architecte de solution :
    - Plan terminé
    - Mise hors service de l'application approuvée
    - Application hors ligne - lors de la définition de cette date, tenez compte de l'impact sur vos utilisateurs, car ils ne pourront plus accéder au service après cette étape.
    - Point de non-retour
    - Fin du service connexe - lors de la définition de cette date, tenez compte des SLA, des licences et des garanties. Le service associé est engagé dans ces accords jusqu'à ce jalon.
    - Mise hors service terminée
    - Données supprimées

Jalon : Plan terminé - Le plan de mise hors service de l'application est terminé.

Étape 3. Obtenir l'approbation finale.

- [ ] L'architecte de solution soumet le plan de mise hors service à tous les directeurs informatiques concernés pour examen et approbation.
- [ ] L'architecte de solution vérifie que les équipes des directeurs informatiques approuvent le décommissionnement de l'application avec ses impacts et le plan de migration, si nécessaire.
- [ ] Le chef de projet soumet une demande de changement pour mettre hors service l'application pour examen et approbation.

Jalon : Décommissionnement de l'application approuvé - L'exécution de la mise hors service de l'application peut se poursuivre.

Étape 4. Mettre l'application hors ligne.

- [ ] Le chargé de projet exécute le plan de communication qui comprend la redirection des utilisateurs vers les alternatives.
- [ ] Le chargé de projet communique les dates de mise hors ligne et de fin de l'application, ces dates étant les plus importantes, à :
    - Les utilisateurs de l'application et du service associé.
    - Les autres services informatiques qui utilisent cette application.
    - La Comptabilité informatique (si nécessaire)

- [ ] Si l'application est accessible au public, la communication nécessite que le secteur d'activité concerné annonce publiquement la date de mise hors ligne de l'application
- [ ] L'architecte de la solution et l'équipe produit se préparent à mettre l'application hors ligne au moment de la date de mise hors ligne. Les utilisateurs ne pourront plus accéder au système après la date de mise hors ligne du service.
    - L'architecte de solutions modifie l'inventaire de l'application Hopex pour refléter l'état du processus de décommissionnement de l'application.
    - L'équipe produit envoie une demande de service informatique pour supprimer les accès à l'application en cours de décommissionnement (voir Checklist Gestion des Identités et des Accès).
    - L'équipe produit envoie une demande de service informatique pour modifier la surveillance et placer l'application en mode maintenance.
    - L'équipe produit informe l'équipe de sécurité que l'application sera mise hors service et quand arrêter les balayages de sécurité (voir Checklist Sécurité Applicative).

Jalon : Application hors ligne - L'application n'est plus disponible pour les utilisateurs.

Étape 5. Mettre l'application hors service.

Remarques :

- Durant cette phase, l'application reste toujours prête à redéployer si besoin.
- Les ressources sont toujours allouées jusqu'à la date de fin : personnel, matériel, cloud.
- [ ] L'équipe produit crée une archive de l'objectif de décommissionnement tel qu'il était à la date de mise hors ligne :
    - Inclure dans cette archive les archives de données qui existaient dans le cadre des opérations normales
    - Respecter toutes les réglementations d'archivage des données
    - Continuer à honorer le plan d'archivage existant après le décommissionnement
    - Stocker l'archive dans un format utilisable
    - Supprimer les autres données, à moins qu'elles ne soient nécessaires
    - Vérifier que la date de suppression des données sera respectée
- [ ] L'équipe produit améliore la documentation de l'application avec les informations de décommissionnement :
    - Comment accéder aux archives de l'application décommissionnée
    - Sur quoi repose cette application (fournisseurs, matériel)
    - Qui a travaillé sur l'application et le service connexe.
    - Le code source reste dans le référentiel de code pour référence et réutilisation dans d'autres projets
- [ ] L'équipe produit s'assure d'arrêter de facturer les lignes d'affaires utilisatrices (si nécessaire).
- [ ] L'architecte de solution vérifie la migration de toutes les fonctions identifiées comme encore nécessaires et supprime l'entrée pour les services correspondants du catalogue de services informatiques (si nécessaire).
- [ ] L'équipe produit s'assure d'informer les équipes informatiques concernées de la mise hors service, informe de la date de fin de l'application et demande la désactivation rapide des ressources informatiques associées en envoyant une demande de service informatique en conséquence (voir la section Checklist).

Jalon : Point de non-retour - Les préparatifs pour mettre hors service l'application sont terminés.

Étape 6. Terminer l'application.

- [ ] Les équipes des ressources informatiques peuvent procéder à la suppression des ressources récemment désactivées (voir la section Checklist).
- [ ] L'équipe produit désalloue les ressources cloud connexes (si nécessaire).
- [ ] L'architecte de solution et la comptabilité informatique s'assurent d'examiner les besoins en licences et d'arrêter de payer les factures des fournisseurs (si nécessaire).
- [ ] L'architecte de la solution ou la comptabilité informatique s'assure de fermer tous les comptes tiers liés (si nécessaire).
- [ ] L'équipe de produit s'assure d'informer l'équipe d'infrastructure du retrait ou de la réaffectation du matériel.
- [ ] L'équipe d'infrastructure procède au retrait/réaffectation des matériels. Il comprend souvent, mais sans s'y limiter, les éléments suivants (voir la section Matériel de la Checklist)
- [ ] Archivage du code source et de la documentation. S'assurer qu'aucune information personnelle ou secret n'y soit contenu.
    - Informations personnelles : Informations sur un utilisateur de l'application

    - Secret : Clé d'API, identification de connexion, mot de passe, etc.

Jalon : Fin de l'application – Les ressources de l'application ont été supprimées

Étape 7. Conclure la mise hors service.

- [ ] Le directeur informatique désaffecte les ressources humaines. Le personnel de l'équipe produit devient disponible pour d'autres projets.
- [ ] Le chargé de projet de décommissionnement signe comme quoi le projet de décommissionnement est complété.

Jalon : Le décommissionnement est terminé (à célébrer).

Étape 8. Effectuer la post-mise hors service - Suppression des données

- [ ] L'architecte de solution supprime l'archive et toute données conservées, sauf s'il est nécessaire de les conserver. Le cas échéant, celles-ci doivent être anonymisées:Guide d'anonymisation (https://ia-docs-devops.azurewebsites.net/fr/Test/Principles/PiiProtection.html?q=renseignement)
- [ ] L'architecte de solution supprime l'entrée de l'inventaire de l'application Hopex.
- [ ] L'architecte de solution notifie de la libération de la licence de la plate-forme d'archivage.
- [ ] L'architecte de solution supprime les archives de conteneur pour les différents environnements, le cas échéant.
- [ ] Existe-t-il un engagement contractuel ou légal qui vous oblige à garder le code source pour une durée déterminée?
    - L'architecte de solution supprime le code source de l'application, des applications connexes, ainsi que tout ce qui est lié aux « repositories » :
        - Service Connections
        - Pipelines
        - Artifacts
        - « Repositories » liés (outils, librairies, etc.)
        - Documentation (wiki).
    - Supprimer les entrées de tests de code automatique. Il pourra être nécessaire de créer une demande ServiceNow. (https://iaaesf.service-now.com/sp?id=sc_cat_item&sys_id=d3ecc9fe87ae9d103555fea6dabb356b&sysparm_category=614fe3bc97b8691064f23a500153af7a)

Jalon : Données archivées supprimées – L'archive finale du service est supprimée.

Checklist des ressources logicielles TI

Gestion des ressources TI logicielles à désactiver (étape 5) et à supprimer (étape 6).

	Ressource TI	**Équipe informatique associée à notifier (Service Now)**	**Procédure spécifique**
☐	Ressources infonuagiques (cloud)	Équipe produit et Architecte de solution	Étape 6
☐	Licences de logiciels tiers	Équipe produit et Comptabilité TI	Étape 6, 8
☐	Certificats publics et privés (par exemple, révoquer le certificat de signature de code, iA SSL Cert, Entrust)	Opérations de sécurité – Cryptographie	Étapes 5, 6
☐	Règles de pare-feu	Opérations de sécurité – Sécurité réseau	Étapes 5, 6
☐	Enregistrements DNS public et privé	VPTI – BackOffice (iA) et Équipe produit (Azure subdomain)	Étapes 5, 6
☐	Comptes de messagerie (par exemple, iA, comptes tiers spécifiques comme les adresses Google ou Amazon)	VPTI – BackOffice (iA) et Équipe produit (comptes tiers)	Étapes 5, 6
☐	Comptes de service (par exemple, compte de service LDAP, compte de service AD)	Gestion des identités et des accès – Implémentation	Étapes 5, 6 See Guideline

	Ressource TI	Équipe informatique associée à notifier (Service Now)	Procédure spécifique
☐	Gestion des accès utilisateurs (Application de Sécurité, Job-araignée)	Gestion des identités et des accès – Implémentation	Étapes 5, 6 See Guideline
☐	Services de sauvegarde (par exemple, CommVault)		Étapes 5, 6, 8
☐	Surveillance automatisée (par exemple, Splunk)		Étapes 5, 6
☐	Balayages de sécurité des applications et pare-feu d'application Web	Opérations de sécurité – Sécurité applicative	Étapes 5, 6
☐	Archiver les informations sur les vulnérabilités	Opérations de sécurité – Gestion des vulnérabilités	Étape 5
☐	Gérer toute liste blanche similaire des autres systèmes		Étapes 5, 6
☐	Modifier les entrées d'inventaire de l'application Hopex pour refléter l'état du processus de déclassement	Architecte de solution	Étapes 5, 6, 8
☐	Supprimer de la liste de classification PCI et/ou PII	Conseillers SI	Étape 5
☐	Supprimer les descriptions de poste	Directeur TI	Étape 5

Checklist des ressources matérielles TI

Gestion des ressources TI matérielles (Étape 6).

	Ressource TI	Équipe informatique associée à notifier (ServiceNow)	Procédure spécifique
☐	Désenregistrer les adresses MAC		Étape 6
☐	Documents d'étiquette d'inventaire / formulaires d'inventaire		Étape 6
☐	Retourner le matériel loué		Étape 6
☐	Envoyer les disques durs à l'équipe d'infrastructure pour élimination		Étape 6
☐	Avertir le responsable de la salle des machines que les ports réseau et/ou l'espace du rack sont disponibles		Étape 6
☐	Réutiliser ou retirer le matériel		Étape 6

Guides pour les équipes des ressources informatiques connexes

Opérations de sécurité (Cryptographie)

À définir...

Opérations de sécurité – Sécurité réseau

À définir...

Gestion des identités et des accès – Implémentation

Étendue actuelle des responsabilités de l'équipe GIA pour la gestion des applications

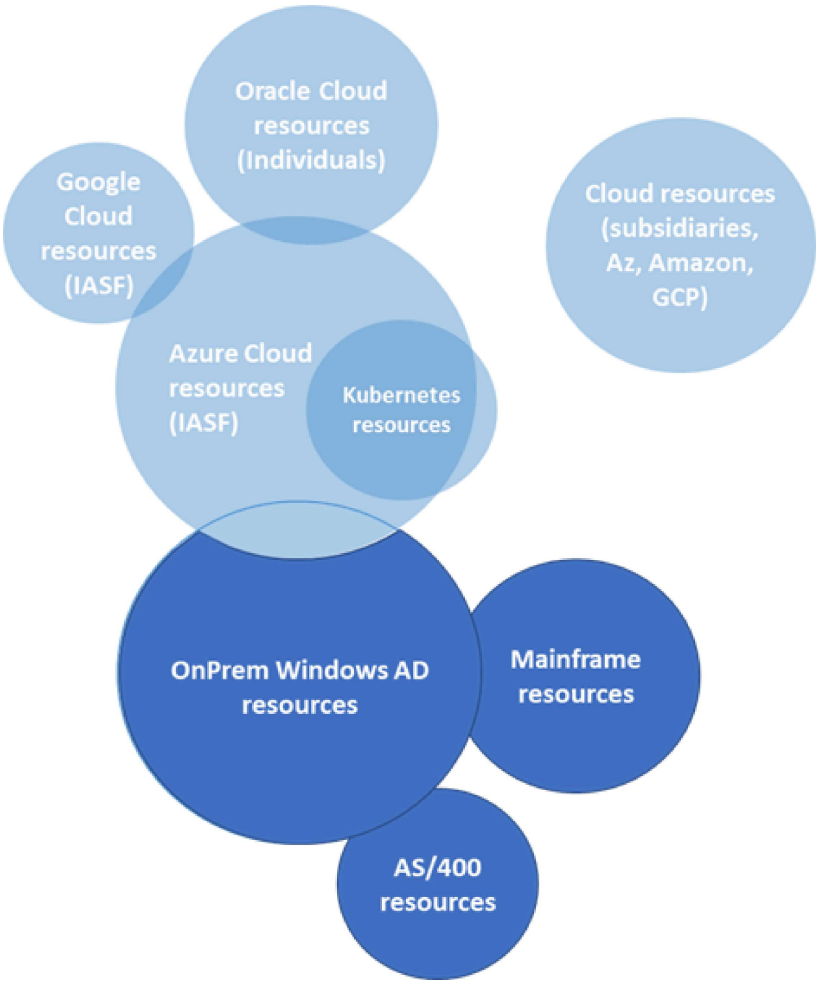

Pendant le processus de décommissionnement

L'équipe produit doit demander votre service lors de la préparation de l'étape 4. Mettre l'application hors ligne jusqu'à l'étape 6. Terminer l'application.

Les activités ci-dessous sont les plus pertinentes, mais les demandes peuvent différer selon chaque contexte.

Étape 4. Mettre l'application hors ligne.

Activité : Supprimer l'accès des utilisateurs à l'application en cours de décommissionnement

- [ ] Désactiver l'accès à l'application en supprimant les comptes d'utilisateurs et de services des groupes AD.
- [ ] Désactiver le groupe d'accès depuis l'« Application de sécurité » (https://au.webui.ia.iafg.net/AUMWPN02/#/suivi-demandes) afin que le groupe ne puisse plus être demandé dans le futur (besoin d'une demande d'implantation).

Étape 5. Préparer à mettre hors service.

Activité : Désactiver les comptes de service

- [ ] Désactivez tous les comptes de services associés pour l'application et ses composants. Note: La demande doit mentionner tous les composants et comptes de service utilisés par l'application qui doivent être désactivés.

Étape 6. Terminer l'application.

Activité : Supprimer des ressources IAM

- [ ] Supprimer tous les comptes de service récemment désactivés
- [ ] Supprimer tous les groupes d'utilisateurs utilisés par l'application

Évaluation périodique des ressources IAM inutilisées

Pour une raison quelconque, les équipes de GIA peuvent ne pas avoir été informées d'un décommissionnement passé d'une application. Par conséquent, les équipes de GIA doivent effectuer des évaluations de sécurité périodiques et nettoyer les ressources GIA inutilisées.

Activité : Analyse des ressources GIA inutilisées (périodique, 3 mois)

- [ ] Utiliser un script pour découvrir les comptes de service inutilisés
- [ ] Utiliser un script pour découvrir les ressources de gestion des utilisateurs inutilisées
- [ ] Informer l'architecte de la solution, responsable des comptes de service et des ressources de gestion des utilisateurs, des risques de sécurité et de la bonne gestion des ressources de GIA.

Activité : Nettoyer les ressources GIA en conséquence (périodique, 3 mois)

- [ ] Obtenir l'approbation de l'architecte de la solution pour procéder au nettoyage
- [ ] Après approbation, désactivez rapidement tous les comptes de services associés et les ressources de gestion des utilisateurs
- [ ] Dans 3 mois, nettoyer les ressources inutilisées en conséquence |

Opérations de sécurité – Sécurité applicative

Étape 8. Effectuer la post-mise hors service - Suppression des données

- [ ] Répondre aux demandes de suppression des application dans les outils de test automatisés (SCA, SAST, DAST, Container security, IaC), le cas échéant.

Opérations de sécurité – Gestion des vulnérabilités

À définir...

Conseillers en SI

À définir...

Registre d’approbation

Approbateur	Date
Bobby Lavoie, Concepteur Sécurité*, Protection et analyse en sécurité de l’information*	2022-02-02

Historique des révisions

Version	Changement	Date
1.0	Création du document	2022-01-17
1.1	Conversion vers Markdown	2025-03-12

Références

Ce guide est adapté des meilleures pratiques informatiques pour le décommissionnement de services de l'Université du Nebraska disponible à l'adresse Web suivante : https://its.unl.edu/bestpractices/decommissioning-process-guide (https://its.unl.edu/bestpractices/decommissioning-process-guide) Norme sur la sécurité des applications (https://indall.sharepoint.com/:w:/r/sites/securite/Documents%20partages/3%20-%20Cadre%20normatif/3%20-%20Normes/S%C3%A9curit%C3%A9%20des%20applications.docx?d=wb33b43dfb0994c52b35ef263473cc38c&csf=1&web=1&e=mD2ubO) iA NFRs - SS-RELI-11 – Gérer et réduire efficacement la dette technologique (https://indall.sharepoint.com/%3Aw%3A/r/sites/vpti-8AE/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7B5E678479-D673-45FC-B4C4-9B43B713738C%7D&file=iA%20ENFs%20-%20Exigences%20non%20fonctionnelles.docx&action=default&mobileredirect=true)

Dernière modification de cette page le 03/21/2025 13:17:16 +00:00 (UTC).
